

Kjøleboks

Isboksen i Willingen har fungert bra i alle år med is i boksen.

Avhengig av kvaliteten på isen og ute temperaturen har den holdt seg kjølig i 2 til 4 dager.

Isoterm har kommet på markedet med en kjølepakke på 12 volt bestående av kompressor, O-evaporator og termostat til en akseptabel pris.

Denne passer ypperlig til montering i Willingens isboks.

I tillegg til standard pakken ble det kjøpt 2 X 3 meter ekstra rør.

Selve O-evaporator og termostaten er montert i forkant av isboksen.

Kompressoren er montert opp under dekket på skott inn mot styrbord stikk køye i det aktre stuvrommet.

Det er montert et plastrør mellom isboksen og det det aktre stuvrommet på styrbord side. Kjølerørene er trekt inne i dette røret. Kjølerørene må isoleres, og koplingene må plasseres i aktre stuvrom og inne i kjøleboksen. Dette for å forhindre isdannelse og kondens i hyllene i styrbord stikk køye.



O-evaporator og termostad er montert i forkant av isboksen.

Denne har en "fryseboks" der de fleste kjøleelementene er lagret.


Fordamperen ("fryseboksen") også kan brettes ut for å få større kjøleflate.



Øverst på skottet mot aktre stuvrom i styrbord stikk køye sees o nedre boltene som holder kompressoren på plass.



Plastrøret til de isolerte kjølerørene mellom O-evaporator og kompressor.

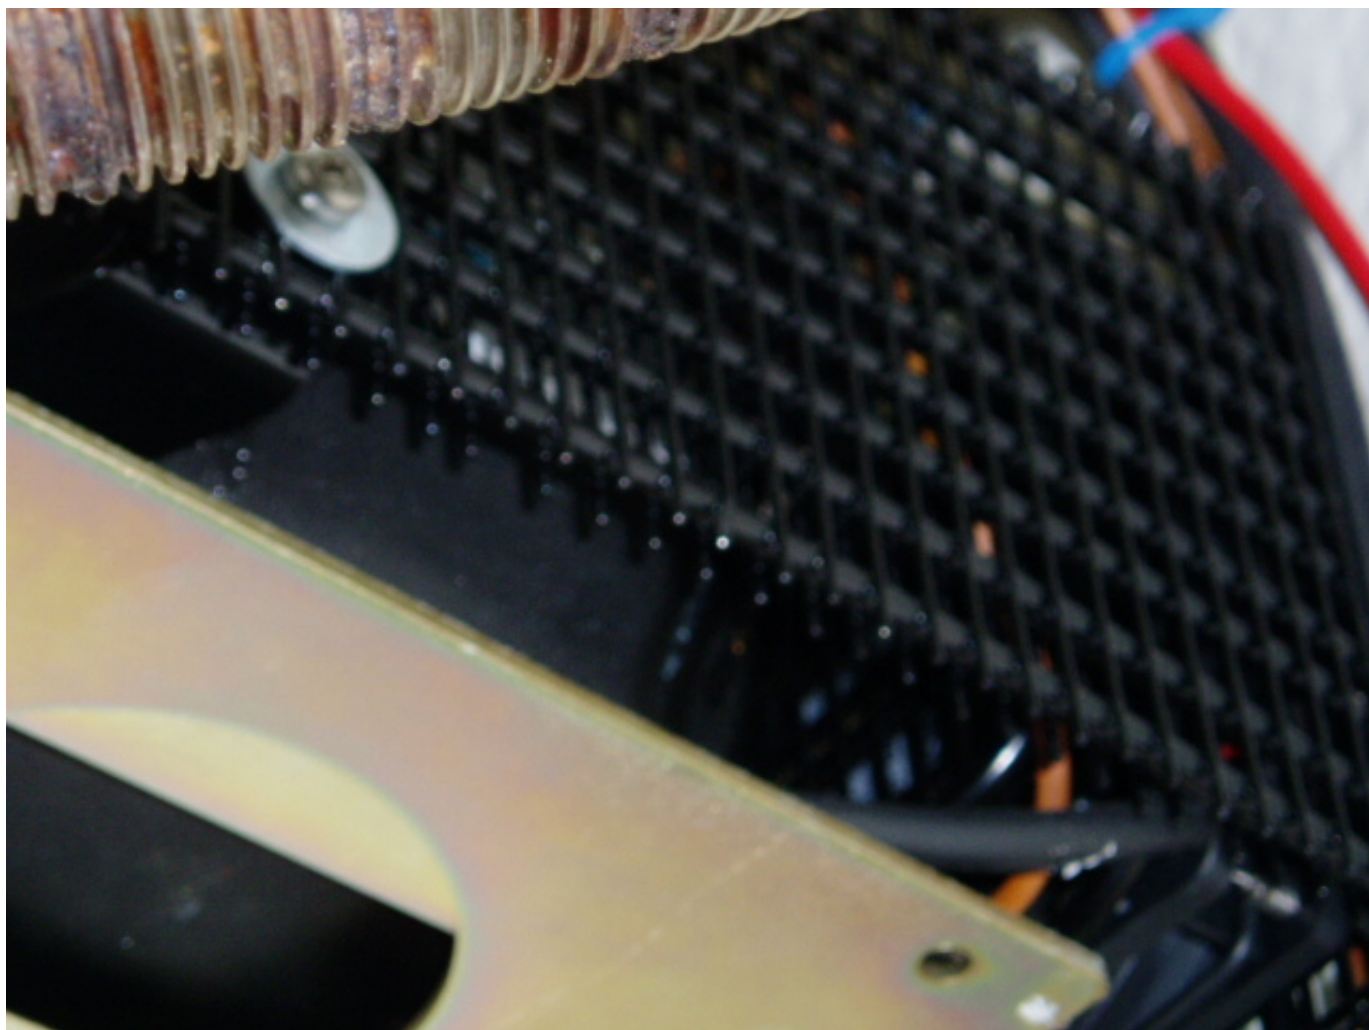

Kompressoren montert under dekk i på skottet inn mot styrbord stikk køye.



Koplingene på kompressoren.
